

8. CAPÍTULO 10 DE SEÑALIZACIÓN:

- La variación de precios unitarios respecto del modificado se debe a un error. Las mediciones de unidades de obra correspondientes al capítulo de pavimentación se han incluido en dicho capítulo.
- Siguiendo las indicaciones de la Policía Local se realizan los siguientes trabajos: Desmontaje de semáforo de peatones en el cruce de la Avenida Suñer Orvig (continuación de la Avenida Vicente Vidal) esquina con la calle Independencia, desmontaje de semáforo de vehículos en la calle Joanot Martorell, y por último, restauración de semáforo, montaje y cimentación del mismo.
- Se incluye en este capítulo el desmontaje y montaje de guardarrail, ejecutado debido a la ampliación de la rampa de bajada al barranco.
- Una vez ejecutado por completo el capítulo de señalización, la Policía Local realiza una nueva visita a la obra en la que pide:
 1. Pintado de banda amarilla junto al bordillo derecho de la calle Camí de la Arena, desde la rotonda en sentido a la calle León Matases, para prohibir la parada - estacionamiento en el carril de circulación, formando triángulo de exclusión al tráfico para el encauzamiento del mismo antes del paso peatonal y el principio del carril de estacionamiento:



DILIGENCIA.- Per e fer constar que amb aquest projecte ha estat sotmès a estudi i aprovació pública per serà el *José L. Aranda* en la sessió de:

Alcalde, en la funció del
EL SECRETARI
JPD.

2. Pintado de banda amarilla junto al bordillo derecho en la Avenida del Parque, desde el cruce con la Avenida Vicente Vidal en sentido ascendente, para prohibir la parada - estacionamiento en el carril de circulación, finalizando antes del paso de peatones y formando un triángulo en el acceso del Vidal / para dirigir la circulación por el carril único. Por otra parte falta pintar la línea de detención en el paso peatonal:



3. Pintado de banda amarilla junto al bordillo derecho en la Avenida del Parque, en sentido descendente hacia la Avenida Vicente Vidal, para prohibir la parada - estacionamiento en el carril de circulación, hasta el paso peatonal de cruce con semáforo. Por otra parte falta pintar la línea de detención en el paso peatonal y las flechas de dirección ante el paso peatonal:



4. En la entrada al Vial 7 falta señal R-100 con plaqueta (excepte acces a guais) más poste en costado derecho.



5. En la entrada al Vial 6 desde la calle León Motoses falta poste y señal R-100 más plaqueta (excepte acces a guais) en el costado derecho e izquierdo.



6. En el Vial 2 visto desde el cruce con la calle Camí de la Arena, quitar la placa R-308 de estacionamiento prohibido y poner otra placa R-100 más plaqueta (excepte acces a guais) en poste derecho.



DILIGENCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del Ple de l'Ajuntament, en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
P.D.


7. En el Vial 4 visto desde el cruce con la calle Camí de la Arana, quitar la placa R-308 de estacionamiento prohibido y poner otra placa R-100 más plaqueta (excepte acces a quals) en poste derecho.



8. En el Vial 5 visto desde el cruce con la calle Camí de la Arana, quitar la placa R-308 de estacionamiento prohibido del poste derecho y poner otra placa R-100 más plaqueta (excepte acces a quals) en poste derecho.



9. En el Vial 8 visto desde el acceso de la con la Subida de Ballaró, quitar la placa R-308 de estacionamiento prohibido del poste derecho y poner otra placa R-100 más plaqueta (excepte acces a quals) en poste derecho.

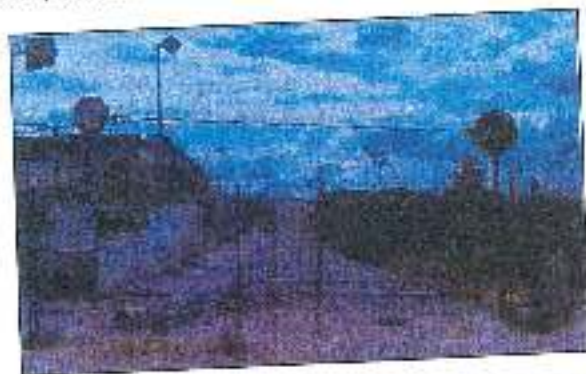

10. En la Acera 2 visto desde el acceso de la calle Pavía, quitar la placa R-308 de estacionamiento prohibido del poste derecho y poner otra placa R-100 más plaqueta (excepte acces a guais) en poste derecho. La placa R-100 del poste izquierdo está colocada al revés.



11. En la calle Pavía vista hacia el acceso a la rotonda, falta colocar placa y poste R-400 en la isleta anterior a la rotonda. También falta pintar las líneas de detención en el paso peatonal.



DEFINICIÓN. Por favor contar que aquest projecte ha estat sotmès a l'informació oberta i per decisió del Servei d'Urbanisme en la sessió de

Alzira, en la feula del

EL SECRETARI

P.D.


12. En la Acera 4 visto desde el acceso de la calle Pavía, quitar la placa R-308 del poste derecho. Cambiar la placa R-100 y plaqueta del poste izquierdo al derecho. Cambiar la placa de stop R-2 del poste derecho al izquierdo.



13. En la Acera 3 vista desde el acceso de la calle Pavia, quitar la placa R-308 y poste izquierdo que la soporta.



14. En la calle Pavia, colocar tres placas R-308 de prohibido estacionar con sus correspondientes postes. Estas tres placas serán de las retiradas de los apartados anteriores y sólo nos harán falta dos postes para este caso, ya que disponemos de un poste del apartado anterior. La señalización se colocará en el acceso por la calle Virgen de la Murta, acera derecha, y en el acceso por la rotonda en acera derecha. También después del Vial 1 en la acera derecha.

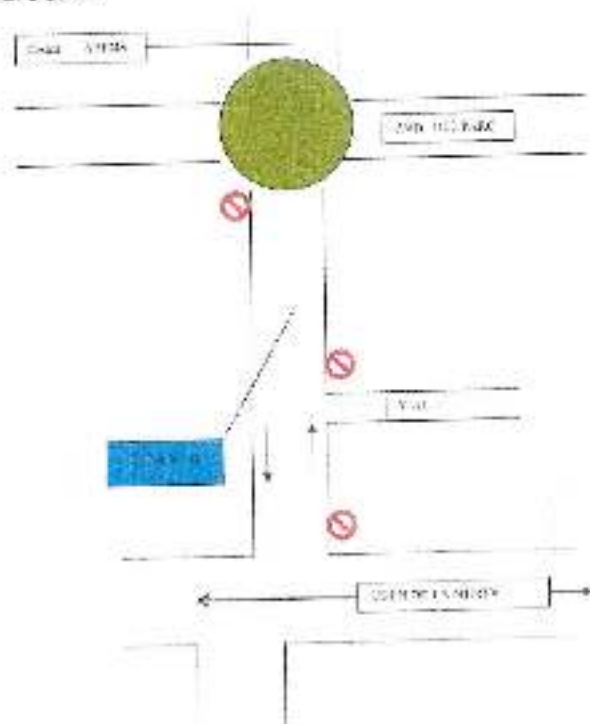

15. En el Vial 9, visto entre el Vial 1 y la calle Virgen de la Muria, falta pintar el paso de peatones y la correspondiente línea de detención. También falta pintar el triángulo de ceda al paso y su correspondiente línea de detención.



DILIGENCIA.- Para hacer constar que aquest projecte ha estat submès a informació pública per acord del Ple de l'Ajuntament, en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
P.D.

16. En el Vial 1, visto desde el acceso de la calle C/ y Torrón, falta colocar tres placas R-306 y tres postes. La calle es de sentido único por lo que hay que señalar a ambos lados dos en la acera izquierda y una en la derecha. Falta pintar la flecha de carril de sentido único.



Una vez realizadas las modificaciones anteriores, se realizó una nueva visita a obra, cuyos resultados son los reflejados en el plano de señalización que se adjunta en el apartado de planos.

A continuación se presentan los precios contradictorios con los precios correspondientes al modificado aprobado por el ayuntamiento:

OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓN (PRIM) DEL IVI "FUERTO DE BAYARÓN"	PROMOTOR	AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO "FUERTO DE BAYARÓN"
	LOCALIDAD	ALTAIR, PUEBLO LIBRE
	CONSTRUCTORA	CONSTRUCIONES DE BAYARÓN S.L.
	FECHA	17/02/2018

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

Modificació acabada pel Ajuntament d'Altaira, segons de cada el plec H-1 del plànol

MOBILIARI:
 0. Seral de pedra irregular de 70 cm de cada costats MORT referent sobre pedra

gavallada de 60x40x2 mm i 2 m de longitud, mitja coberta, acabats i tonteries

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Obra: 1ª Construcción	1	0,250	24,00	3,25 €
	Peqr. Obra de construcción	4	0,250	18,00	4,31 €
	Seral: Pedra irregular 70 cm	1	1,000	50,40	50,40 €
	Pav. gavalada 60x40x2 mm 2 m altura	2	2,000	15,14	30,28 €
	H-15 plec de OBRA (PRIM) de B.R.	17	0,016	35,27	0,59 €
	C/ 90' costes directes			Subtotal	128,83 €
				Total:	128,83 €

ASCENDRE A DIENTO VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.

REPERCUSIÓN ECONOMICA ESTIMADA

Código	Design	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PC4	0. Seral de piedra irregular de 70 cm de cada costats MORT referent sobre pedra gavalada de 60x40x2 mm i 2 m de longitud, mitja coberta, acabats i tonteries	9,00	26,93 €	1.142,37 €
Sustituye a:					
Código	Design	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusión Económica Estimada:					1.142,37 €

La Empresa
 CONSTRUCCIONES DE BAYARÓN S.L.
 P. P. *[Signature]*
 Calle ...

El Director de Obra

 CAJEROS DE ADMINISTRACIÓN
 Calle ...

AGRUPACIÓN INTERÉS URBANÍSTICO
 FUERTO DE BAYARÓN
[Signature]
 Calle ...



DILIGENCIA. - Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del *[Signature]* de l'Ajuntament en la sessió de

Altaira, en la fecha del
EL SECRETARI
 P.D.

OBRA: PROYECTO DE IRRIGACIÓN PARA DEL PAU BUENOS GALIANY	PROMOTOR:	AGREGACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO CUARTO DE GALIANY
	LOCALIDAD:	AGRIEROS (BA) (BA)
	CONSTRUCTORA:	LLORCA S.A.
	FECHA:	14/1/2009

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

MODIFICACIÓN:

Modificación solicitada por el Ayuntamiento (Alcaldía) según presupuesto número 5-13.

NUÉVOS PRECIOS:

CONCEPTO: Unidad Informativa servicio complementario, rectangular 60x40 cm, normas MOP7, referente sobre poste galvanizado de 50x40 mm y 2 m de longitud, incluye colocación andamios y bitánera.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Oficial 1ª Construcción	h	0,250	21,70	5,28 €
	Poste Ominado construcción	m	0,250	18,82	4,91 €
	Señal peso peatones	u	1,000	30,47	30,47 €
	Poste galvanizado 60x40/2mm 2m altura	m	0,300	10,14	30,26 €
	H-15 banda 25 CCM IVA P 42,5 R	m²	0,015	66,27	0,98 €
Tres veces precios				Subtotal	131,03 €
				Total:	151,83 €

ARROBADO A CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:

Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PC42	1 Señal informativa servicios complementarios, rectangular 60x40 cm, normas MOP7, referente sobre poste galvanizado de 60x40 mm y 2 m de longitud, incluye colocación andamios y bitánera	25,00	131,03 €	3.293,64 €
Sustituye a:					
Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusión Económica Estimada:					3.293,64 €

La Empresa
 LLORCA S.A.
 P. [Signature]

El Director de Obra

AGREGACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO
 CUARTO DE GALIANY
 [Signature]

OBSERVACIONES:



DILIGENCIA. Por a fin constar que aquest
 presento ha estat sotmes a informació
 pública per acord del JCA de l'Ajuntament
 en la sessió de

avui, en la fecha del
 EL SECRETARI
 MD.

OBRA: PROYECTO DE PROMOCIÓN PISA DEL PAU "IBERTO GALVÁN"	PROMOTOR	AGURRUALDE DE ATRRES ORGANITZAZIO "IBERTO GALVÁN"
	LOCALITAT	AZIRA, NAVARRA
	CONSTRUCTORA	VALLE S.M.A. S.L.
	FECHA	07/04/2012

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

MOTIVACIÓN:

Modificación efectuada por el Ayuntamiento de Azira, según slop N.º 2 del pliego

NUÉVOS ÍTEMES:

CONCEPTO: a) Señal de stop octogonal de 60 cm. normas MOPR, reflectante, sobre placa galvanizada de 1,5

m de largo e frías de color negro, indicio colorido, encajes y montaje

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UC	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Unidad P ^o Class. asfalt	U	0,250	21,10	5,28 €
	Reda octogonal construida	U	0,050	19,31	4,01 €
	Señal Stop 60 cm. Coloreda	U	1,000	110,02	110,02 €
	Poste galvanizado 60x40x2100 mm H.L.2	U	2,000	15,14	30,28 €
	H. 15 blanca 20 CEM 165 P 42,5 R	U	0,015	38,97	0,58 €
	Cinco ítems de suma			Suma	151,48 €
				Total:	151,48 €

ASCIENDE A CINCO CIENTO Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:

Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PC43	- Señal de stop octogonal de 60 cm. normas MOPR, reflectante, sobre placa galvanizada de 1,5 m de largo e frías de color negro, indicio colorido, encajes y montaje	10,00	151,48 €	2.272,15 €
Sustituye a:		cupres. actualización: Arboles y jardines			
Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Reparación Económica Estimada:					2.272,15 €

La Empresa

El Director de Obra

AGURRUALDE INTERMUNICIPAL

CONTRATO N.º 15/A

 14/04/2012


 Pedro Garmendia, 25, Euzko Jaurlaritzaren
 Bilbo, 48940


 AYUNTAMIENTO DE AZIRA
 IBERO GALVÁN
 14/04/2012

RESERVACIONES:



DILIGENCIA. - Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del 10/4 de l'Ajuntament, en la sessió de

Azira, en la fecha del
EL SECRETARI
 P.D.

OBJETO: PROYECTO DE IRRAWADDION HERRA DEL PÁRQUEO GALVAÑÓN	PROMOTOR:	AGRUACION DE INTERES URBANISTICO HERRA GALVAÑÓN
	LOCALIDAD:	AUTONOMA ENCIEN
	CONSTRUCTORA:	INDEPENDIA SA
	FECHA:	04/02/2012

MODIFICACION UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

NO EFECTUADA: Modificación solicitada por el Ayuntamiento de Abita Señales de 40x20

Nueva Proposición: Señales de 40x20 cm de lado y 35x30 cm de lado, normas MOPT, referencio sobre poste galvanizado de 95x40x2 mm y 3 m de longitud, pintura protección, anclajes y cornisa.

CODIGO	DESCRIPCION	UD.	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Obra 1ª Señalización	m	1,000	21,10	21,10 €
	Poste Ordenado señalización	m	3,250	18,50	60,12 €
	Señal N.º 40x20 cm y 35x30 cm	m	1,000	16,25	16,25 €
Otras obras de obras:				Subtotal:	97,47 €
				Total:	97,47 €

ASCIENDE A OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO

REPERCUSION ECONOMICA ESTIMADA:

Código	Descripción	Unidades	Precio	Total
10	Señal informática servicios complementarios normas MOPT referencio sobre poste galvanizado de 95x40x2 mm y 3 m de longitud, pintura protección, anclajes y cornisa	18,00	38,43 €	1.521,70 €

Sustituye a:

Código	Descripción	Unidades	Precio	Total

Total Repercusión Económica Estimada: 1.521,70 €

La Empresa

El Director de Obra

AGRUACION DE INTERES URBANISTICO
 HERRA GALVAÑÓN
 REPRESENTACION DE INTERES URBANISTICO
 HERRA GALVAÑÓN

CONCLUSIVO
 LLOP...
 P.P.
 [Firma]

EA, ESTUDIO DE PROYECTOS S.A.
 [Firma]

OBSERVACIONES:

Plaz Señales de 40x20 cm de lado y 35x30 cm de lado, normas MOPT



DILIGENCIA: Por a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.º de la Ley 17/2003, de 15 de mayo, de acceso a la información pública, se ha procedido a la publicación de esta información en el portal de acceso a la información pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Acta de la reunión del
 DE SECRETARÍA
 M.

OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓN PREDIO DEL FUERTO GALVAÑÓN	PROMOTOR	AGRUPACIÓN INTERÉS URBANÍSTICO FUERTO GALVAÑÓN
	LOCALIDAD	ALZIRA (VA)
	CONSTRUCTORA	LUCEP Y CIA S.L.
	FECHA	01/04/2019

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

MODIFICACIÓN

Modificación solicitada por el Ayuntamiento d'Alzira: señal P-15b del plano

CONCEPTO

Señal de peligro triangular de 70 cm. normas MOP¹ reflectante sobre placa galvanizada de 80x40x2 mm y 2 m de longitud, incluso colocación, anclajes y pintura.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Óxido 11. Eliminación	m	0,700	21,10	14,774
	Peón Ordeñeta constructor	F	0,700	-0,60	13,740
	Señal P-15b y placa de 80x20	m	1,000	125,00	125,000
	Poste galvanizado 80x40x2 mm y 2 m	m	2,000	15,14	30,280
	H-15 blanco 23 CEM I/A/P 43,5 R	m ²	0,720	66,27	1,862
	Otros costes directos			5,000	185,450
				Total:	185,45 €

ASCIENDE A CINCO CIENTOS Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA

Detalle	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PU6a	Señal de peligro triangular de 70 cm. normas MOP ¹ reflectante sobre placa galvanizada de 80x40x2 mm y 2 m de longitud, incluso colocación, anclajes y pintura	1,00	185,45 €	185,45 €
Sustituye a:					
Detalle	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusión Económica Estimada:					185,45 €

La Empresa

00611149

LUCEP Y CIA S.L.

[Firma]
 Alzira, 01/04/2019

El Director de Obra

[Firma]
 Alzira, 01/04/2019

AGRUPACIÓN INTERÉS URBANÍSTICO

AGRUPACIÓN INTERÉS URBANÍSTICO
 FUERTO DE GALVAÑÓN

Alzira, 01/04/2019

VERIFICACIONES



DILIGENCIA. - Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del Ple de l'Ajuntament, en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
P.D.

OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓ PRIMITIVA DEL BARRIO GALVANON	PROMOTOR	AGENCIACIÓ DE URBANISME I D'INTERIO DE VALÈNCIA
	LOCALIDAD	ALTA VILLORECA
	CONSTRUCTORA	EL PROYECTO S.A.
	FECHA	1/09/2011

MODIFICACIÓ UNIDAD DE OBRA (con repercusi3n econ3mica)

ACTIVACI3N: Desmontaje y montaje de guardamall existente en tejada de balneario por ampliaci3n de altura
 a) Lesi3n del Ajuntament d'Alzira

NOVO PRECIO: 2) Desmontaje y montaje de Guardamall, incluso materiales y mano de obra, encolado de piezas de

C3DIGO	DESCRIPCI3N	UD.	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Oficial *	H	18,000	21,10	379,80 €
	Tecn. especializ. (tr)	H	18,000	19,75	355,50 €
	Gras. costes directos			Subtotal	735,30 €
				Total	653,28 €

ARGUMENTO A SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE EURO

Capitulo	C3Digo	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	6005a	1) Desmontaje y montaje de Guardamall, incluso materiales y	1,00	653,28 €	653,28 €
Sustituye a:					
Capitulo	C3Digo	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusi3n Econ3mica Estimada:					653,28 €

La Empresa

COMPANY

 Firmada en València, a 01/09/2011

El Director de Obra


 València, a 01/09/2011

AGENCIACI3N INTERIO URBANISTICO


 VALÈNCIA

CONSERVACIONES



DILIGENCIA. Per a fer constar que aquest projecte ha estat aprovat i autoritzat mitjançament del **JA** de l'Ajuntament, en la sessi3 de

Alzira, en la fecha del
 01/09/2011
 El SECRETARI
 P.D.

OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓN P-033 DEL P.O. HUERTO GALVAÑÓN	PROMOTOR	AGREGACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO HUERTO GALVAÑÓN
	LOCALIDAD	A. 289 (VIA P.O. 3)
	CONSTRUCTORA	III OBRAS S.A.
	FECHA	2009/02/19

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

MODIFICACIÓN:
 Modificación solicitada por el Ayuntamiento d'Així (19 febrero 2009), en apartaments

NUOVO PRECIO:

CONCEPTO: m Marca viel dos colores en banyoles rondonas e isetas con pintura negra y blanca reflectiva a base de resina acrílica termoplástica y asfetas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso primaraje. PC99

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Oficial P. Pintura	m	0,010	18,86	0,19 €
	Ayudante pintura	m	0,007	18,56	0,12 €
	Pintura realización marcas vielas	l	0,150	7,78	1,17 €
	Pelotas reflectivas	kg	0,000	3,72	0,06 €
	Maquinaria pintabanda	u	0,015	30,00	0,45 €
	Otros costes directos			Subtotal:	2,18 €
				Total:	2,18 €

ASCIENDE A TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE EURO

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:

Capítulo	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PC99	m Marca viel dos colores en banyoles rondonas e isetas con pintura negra y blanca reflectiva a base de resina acrílica termoplástica y asfetas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso primaraje.	600,53	2,18 €	1.322,04 €
Sustituye a:					
Capítulo	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusión Económica Estimada:					1.322,04 €

La Empresa
 III OBRAS S.A.
 P.P.
 Por: *[Firma]*
 Pro. José María Oja

El Director de Obra
 CONYUNTE
 Por: *[Firma]*
 José María Oja

AGREGACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO
 HUERTO DE GALVAÑÓN
 P.P.
 Por: *[Firma]*
 José María Oja

OBSERVACIONES:



DILIGENCIA: Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del *[Firma]* de l'Ajuntament, en la sessió de Així, en la fecha del **EL SECRETARI P.D.**

PROYECTO COMPLEMENTARIO AL P1703 DEL PUERTO GALVAÑÓN	PROMOTOR	AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO HUERTO GALVAÑÓN
	LOCALIDAD	ALZIRA (VA) P.N.O. 6
	CONSTRUCTORA	J.LLORENTE S.A.
	FECHA	12/12/2011

PRECIO CONTRADICTORIO

MOTIVACIÓN:
Obras complementarias a petición del Excmo. Ayto. de Alzira

NUOVO PRECIO: PD100
CONCEPTO: m³ Excavación para la canalización de un sistema de riego de 40x45 cm, con medios mecánicos, máquina retroexcavadora con ayuda manual en las zonas de difícil acceso, transporte y colocación de tubo corrugado de PVC de diámetro 180 mm en tramos sin cables, lechada del tubo con mortero de cemento, incluido carga y transporte de los materiales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Oficial 1ª Construcción	h	0,010	21,10	0,21 €
	Peón especializado	h	0,010	19,73	0,20 €
	Máquina retroexcavadora 70 Cv cuchara hasta 0,34 m³	h	0,010	39,90	0,40 €
	Tubo PVC 180	m	0,100	3,25	0,33 €
	Mortigón en masa H-20	m³	0,03	71,42	1,79 €
	Tela vertedero autorizada	m²	0,50	4,55	2,28 €
	Otros costes directos			Subtotal:	5,19 €
				Total: E.M.	5,19 €

ASCIENDE A DIARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO

REPERCUSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA:

Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PC100	m³ Excavación para la canalización de red de semibras de un sistema de 40x45 cm, con medios mecánicos, máquina retroexcavadora con ayuda manual en las zonas de difícil acceso, transporte y colocación de tubo corrugado de PVC de diámetro 180 mm en tramos sin cables, lechada del tubo con mortero de cemento, incluido carga y transporte de los materiales.	459,12	5,19 €	2.384,12 €
Sustituye a:					
Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusión Económica Estimada: E.M.:					2.384,12 €

La Empresa
 J. LLORENTE S.A.
 P.P.
 Fdo. José López

El Director de Obra
 Fdo. José López

AGRUPACIÓN INTERÉS URBANÍSTICO
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO
HUERTO DE GALVAÑÓN
 Fdo. José López

OBSERVACIONES:



DILIGENCIA: Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per ordre del *JAL* de l'Ajuntament d'Alzira, en la fecha del **EL SECRETARI** *RD*

DESA. PROYECTO DE URBANIZACION PRIVADA DEL BA. HUIERO SALVADOR	PROMOTOR	AGROPACCIÓN MITRES URBANÍSTICO
	LOCALIDAD	HUIERO SALVADOR
	CONSTRUCTORA	AGROPACCIÓN MITRES URBANÍSTICO
	FECHA	15/04/2011

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

MOTIVACIÓN: Recuperación de semáforo para peatrones de la calle Independencia ca. Sufre Crava.

CONCEPTO: U. Desmontaje de semáforo para peatrones con levante de acera, excavación a mano, con mucho compresor hasta diferenciación calle y lateralidad de mástil con utilización de grúa móvil, rotura de suelo y reposición de pavimento asfaltado.

CODIGO	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE	
0001 1º Desmontaje	1	1.000	21,10	105,50 €	
0002 Levante acera	1	1.000	10,73	10,73 €	
0003 Herramienta de mano	1	1.000	76,93	76,93 €	
0004 Pavimento de asfalto (módulo 40x40)	1	1.000	22,37	22,37 €	
0005 Grúa móvil	1	5,30	13,12	69,13 €	
0006 Materia de consumo	1	1,0	68,00	68,00 €	
Grat. costes desgrava				Subtotal	599,02 €
Total: E.M.				599,02 €	

ASCIENDE A: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CENTAVOS DE EURO.

Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
13	PC-03	U. Desmontaje de semáforo para peatrones con excavación de acera, excavación a mano con mucho compresor hasta diferenciación calle y lateralidad de mástil con utilización de grúa móvil, rotura de suelo y reposición de pavimento asfaltado.	1,00	599,02 €	599,02 €
Sustituye a:					
Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusión Económica Estimada: E.M.					599,02 €

La Empresa

El Director de Obra

AGROPACCIÓN MITRES URBANÍSTICO

[Signature]
15/04/2011

[Signature]
15/04/2011

[Signature]
15/04/2011



DILIGENCIA: Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del *[Signature]* de l'Ajuntament en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
P.D.

PROYECTO DE URBANIZACIÓ PER DEL PATRIMONI 06/10606	PROMOTOR	AGrupació d'Interès Urbànic "El Galvanon"
	LOCALIDAD	URB. GALVANON
	CONSTRUCTORA	CONSTRUCCIONS S.A.
	FECHA	19/04/11

MODIFICACIÓ UNITAT DE OBRA (con repercusi3 econ3mica)

JUSTIFICACI3: Recuperaci3 de sentadora para vehiculos de la calle Joanot Martorell

CONCEPTO: a) Desmontaje de sentad3 para vehiculos con levante de tierra, excavaci3 a mano con manto compactado base cimentaci3, cotto y levante de mas3 con utilizaci3 de grua movi- lizar para su hueco y reposici3 de pavimento alacada.

C3DIGO	DESCRIPCI3	UN	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Oficial 1ª Construcci3	h	8.000	21.10	168.80 €
	Tronchador	h	3.000	16.75	50.25 €
	Tronchar en masa H-11	m ²	0.072	78.00	5.62 €
	Pavimento de atraza (manto base + cotto)	m ²	1.000	22.81	22.81 €
	Grua movi-	h	6.00	73.12	438.72 €
	Montaje de cemento	m ³	0.01	38.00	0.38 €
	Grasas y otros directos			Subtotal	712.97 €
				Total E.M.	712,97 €

ASCIENDE A: SETECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEETE C3NTIMOS DE EURO

REPERCUSI3 ECON3MICA ESTIMADA:

C3digo	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	Desmontaje de sentad3 para vehiculos con levante de tierra, excavaci3 a mano con manto compactado base cimentaci3, cotto y levante de mas3 con utilizaci3 de grua movi- lizar para su hueco y reposici3 de pavimento alacada	1.00	712.97 €	712.97 €

constituye a:

C3digo	Concepto	Unidades	Precio	Total

Total Repercusi3 Econ3mica Estimada: E.M. 712,97 €

La Empresa
 conforme


El Director de Obra


AGrupaci3 d'Interès Urbànic


REMARKS:



DILIGENCIA: Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informaci3 publica per acord del Ple de l'Ajuntament, en la sessi3 de

A data, en la fecha del
EL SECRETARI
 P.D.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN PAVES DEL PAV. BARRIO SALVADOR

PROMOTOR: AGRUPACION INTERES URBANISTICO BARRIO SALVADOR
 LOCALIDAD: BARRIO SALVADOR
 CONSTRUCTORA: LOP'S S.L.
 FECHA: 20/05/11

MODIFICACION UNIDAD DE OBRA (con repercusion economica)

Instalación de (10) de semáforos de la calle Independencia seg. Super Drogas

DESCRIPCIÓN: Se trata de la instalación de semáforos en un punto de la calle de la Avenida del Páramo en el barrio de Salvador, con el fin de mejorar la seguridad vial y facilitar el tráfico de los vehículos. El proyecto se compone de la instalación de 10 semáforos, con sus respectivos cables y accesorios, y de la colocación de los cables en los postes de la calle. El presupuesto estimado para esta obra es de 10.488,92 €.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	RENDIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Cable 1/2 conductores	m	5,000	21,10	105,50 €
	Hecho ordinario	m	8,000	18,75	150,00 €
	Horizontación en masa 1/12	m ²	3,570	28,00	100,00 €
	Pavimento de retrazo/módulo a una mano	m ²	2,000	22,97	45,94 €
	Gravado	m ²	8,000	7,012	56,09 €
	Conjunto semáforo instalado	n	1,000	9.487,92	9.487,92 €
	Otros costes directos			Subtotal	10.488,92 €
				Total: E.M.	10.488,92 €

ASCIENDE A DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENA Y DOS CENTAVOS DE EURO

REPERCUSION ECONOMICA ESTIMADA:

Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
10	PC105	Instalación de semáforos en un punto de la calle de la Avenida del Páramo en el barrio de Salvador, con el fin de mejorar la seguridad vial y facilitar el tráfico de los vehículos. El proyecto se compone de la instalación de 10 semáforos, con sus respectivos cables y accesorios, y de la colocación de los cables en los postes de la calle. El presupuesto estimado para esta obra es de 10.488,92 €.	1,000	10.488,92 €	10.488,92 €
Sustituye a:					
Código	Código	Concepto	Unidades	Precio	Total
Total Repercusion Economica Estimada: E.M.					10.488,92 €

La Empresa

El Director de Obra

AGRUPACION INTERES URBANISTICO

CONFORME
 LOP'S S.L.
 de 20/05/2011

OPERA
 LA EMPRESA DE OBRAS DE
 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
 OBRAS DE OBRAS DE
 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
 OBRAS DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

AGRUPACION INTERES URBANISTICO
 BARRIO SALVADOR
 BARRIO SALVADOR



DILIGENCIA. - Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del Reg. de l'Ajuntament, en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
 P.D.

OBRA PROYECTO DE URBANIZACION PP003 DEL PUERTO GALVAÑÓN	PROMOTOR	AGROPACION DE INTERES URBANISTICO DEL PUERTO GALVAÑÓN
	LOCALIDAD	AGROPACION DE INTERES URBANISTICO
	CONSTRUCTORA	LCP S.A.
	FECHA	17/12/2011

MODIFICACIÓN UNIDAD DE OBRA (con repercusión económica)

NOTIFICACION:
Modificación solicitada por el Ajuntament d'Albia

NUOVO PREZIO: PUNTO:
Material: m Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura amarilla a base de resina, perfilado geométrico,
realizado con medios mecánicos, in situ prearmado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UD	REQUERIMIENTO	PRECIO	IMPORTE
	Clase 14 Pintura	m	0,007	21,40	0,15 €
	Aplicación pintura	m	0,007	18,00	0,14 €
	Instalar señal lateral marcas viales	l	0,150	1,28	1,74 €
	Reparación de Máquina para prearmado	m	1,000	0,10	0,10 €
	Otros costes directos			Subtotal:	2,12 €
				Total:	2,12 €

ASCIENDE A DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO

REPERCUSIÓN ECONOMICA ESTIMADA:

Código	Código	Descripción	Unidades	Precio	Total
10	PC107c	m Marca vial de 15 cm. de ancho, con pintura amarilla a base de resina, perfilado geométrico, realizado con medios mecánicos, in situ prearmado.	126,60	2,12 €	212,05 €
Total Reparación Económica Estimada:					212,05 €

La Empresa
LCP S.A.
[Firma]

El Director de Obra
COMPROBADO
[Firma]

AGROPACION DE INTERES URBANISTICO
HUERTO DE GALVAÑÓN
[Firma]

OBSERVACIONES:



DILIGÈNCIA - Per a fer constar que aquest projecte ha estat aprovat i autoritzat pel consell del *[Firma]* Ajuntament, en la sessió de:
Alzaco, en la data del
EL SECRETARI
P.D.

1. PRESUPUESTO.



DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmes a informació pública per acord del *[signature]* de l'Ajuntament, en la sessió de


Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
P.D.

Cuadro de mano de obra


Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad (Horas)	Total (euros)
1	Oficial 1º de construcción.	13,59	13.102,5979	205.246,25
2	Boch especializado construcción.	12,79	6.252,4334	79.597,87
3	Boch ordinario construcción.	12,62	31.054,9144	392.227,55
4	Oficial 1º fontanero.	13,60	45.795,0	624,60
5	Especialista fontanero.	12,79	16.357,0	209,65
6	Oficial jardinero.	13,76	5.572,56	76.637,02
7	Boch jardinero.	11,63	11.100,0	129.4,90
8	Trabaja de decoración jardinería.	8,61	1.865,8904	16.406,82
			importe total:	707.952,92

Gandia, Octubre 2001

E.A. Estudio de Arquitectura, S.L.


 José Tomás Pastor
 Arquitecto



DILIGENCIA. Per a fer constar que aquest projecte ha estat sotmès a informació pública per acord del  de l'Ajuntament en la sessió de

Alzira, en la fecha del
EL SECRETARI
 P.D.



DILIGENCIA.- Para ser válida que aquest
procedo ha estat donada a informació
pública per acord del **JAL** de l'1 d'Agost del 2011,
de la sessió de:

Alum. 27/12/2011

2011-01-0000

R.D.

Cuadro de maquinaria


Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad	Total (euros)
1	Toma de muestra del hornigón fresco incluyendo muestra del hornigón, medida del asiento de vaso, fabricación de hasta 4 probetas cilíndricas de 15x15 cm., curado, retortado y rotura, según UNE 83308, 83301, 83305 y 83304, según I.T. 91.	58,71	19,9000	987,19
2	Trayecto del en laboratorio, según NBR 111 (3 puntos), sin incluir ensayo Prúnica.	175,99	1,9000	175,99
3	Destarificación química para de arena, según norma NLT 113 ó UNE 3534.	15,92	2,0000	113,94
4	Rotómetro de los límites de Atterberg según norma UNE 8337 y 8338 en terrap arena.	51,29	1,0000	51,29
5	Determinación cuantitativa de la materia orgánica según NLT-110-09, oxidación con hidrógeno en terrap arena.	34,13	1,0000	34,13
6	Determinación de la densidad "in situ" incluyendo la humedad (EN 109/72) en terrap arena, según UNE 109.204.	63,1	55,9800	2.371,65
7	Ensayo prúnica modificada según EN 108, en arenas artificiales.	63,27	29,9000	3.264,45
8	Asesinación rápida para ensaio de pino negro de Guezo, suministrada en tabla, de 2,5 m. de espesor, de 10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2,50 m. de largo, considerando 4 mesa.	48,74	0,09000	4,38
9	Asesinación rápida de pino negro de Guezo, suministrada en tabla, balanza, listones, etc., considerando 4 mesas.	56,32	0,21000	11,94
10	Bandaja vibratoria de amescladura de 60x400 mm.	3,00	1.910,5160	5.087,40
11	Excavador autopropulsado de 16 tn.	67,85	565,0900	21.163,71
12	Excavador autopropulsado de 4 tn.	10,51	181,6040	3.328,83
13	Compresor de neumáticos de 100 C.V. y 25 tn.	45,08	45,0900	1.964,02
14	Ap. amadora tracción de 50 C.V. y 12-13 tn.	20,83	45,0900	1.051,70
15	Ap. amadora tracción de 1.-2.00 y 45 C.V.	21,61	29,3200	1.087,50
16	Compresor portátil diésel de 4 ad. de cilindrada y 7 kilos de presión, incluido seguro.	4,00	5.18750	2.222,25
17	Camión hasta 8 tn., de 8 ad de capacidad, con eje, tracción 4x2.	29,37	436,5100	19.050,38
18	Camión de 12 tn., de 10 ad de capacidad, con eje, tracción 4x2.	42,74	690,0000	26.192,00
19	Camión de 12 tn., de 12 ad de capacidad, con eje.	38,73	30,0000	1.362,30
20	Camión de 20 tn., 20 ad de capacidad, con eje, tres ejes tracción 4x2.	52,78	67,4720	3.061,17
21	Camión grúa con 6000 para distingo de trabajo de hormigón, compuesto de tijero y puma.	60,9	439,4990	17.863,46
22	Camión cuba 1000 litros.	34,19	247,6600	2.334,16
23	Camión diésel bituminoso con grupo de calefacción y bomba de 100 ad y 8 ad de capacidad.	60,17	28,8930	1.743,31
24	Hornigónera eléctrica portátil de capacidad 160 l., incluido seguro.	2,57	32,8740	82,84
25	Hornigónera diésel de capacidad 300 l., incluido seguro.	2,60	4.317,1900	10.131,10
26	Vibrador para hornigón de gresol de una rueda de diámetro 20-30 mm. incluido seguro.	2,15	0,0600	0,13
27	Hastillo picador neumático con manopla de 20 m. para compresor.	0,92	511,5750	470,93
28	Grupo electrógeno de 28 kw. de potencia, incluido seguro.	4,00	56.4620	224,00

Cuadro de maquinaria

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad	Total (euros)
29	Pala cargadora de neumáticos de potencia 129 CV, capacidad de la pala 2,7 m ³ .	12,21	505,090h	26.570,78
30	Pala cargadora de neumáticos de potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre 1,4 y 1,7 m ³ .	39,46	2.129,436h	84.521,91
31	Pala cargadora de oruga de potencia 128 CV, capacidad de la pala de 1,55 m ³ .	54,39	348,266h	18.842,19
32	Retransmisor de neumáticos con pala frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la pala frontal 1 m ³ , capacidad de la cabina retransmisor entre 0,07 y 0,26 m ³ .	34,73	2.578,213h	90.079,90
33	Retransmisor de neumáticos de potencia 90 CV, capacidad de cabina entre 0,6 y 0,8 m ³ .	29,21	800,000h	23.576,90
34	Barridos neumáticos autopropulsados de 20 CV.	1,29	61,412h	324,17
35	Barridos de gres 1/4 remolcable.	3,77	4,734h	17,85
36	Extensora de aguas calientes de 70 CV sobre oruga.	59,19	61,590h	4.201,97
37	Planta adicional móvil de 215 CV y 80-80 l/h.	306,46	56,462h	17.246,58
38	Tractor agrícola sobre neumáticos de 70 CV.	19,91	4,730h	94,36
39	Volanteadora de 140 CV.	51,18	408,890h	20.870,25
40	Volanteadora de 130 CV.	52,86	134,397h	7.052,26
41	Breadera.	13,19	43,295h	579,11
42	Colocadora.	3,61	800,000h	2.880,00
43	Bandeja de estabilización que estabiliza el vehículo, en ancho de 800 a.	1,09	50,000h	44,50
44	Señal de seguridad circular de diámetro 80 cm.	16,07	1,660h	26,67
45	Valla de pica metálica de 2,40 m.	30,03	6,990h	209,01
46	Amortiguador contra ruido con arnés a la rueda (amortiguador en cuatro ejes).	8,51	5,000h	42,55
47	Casco de seguridad con arnés de adaptación de material resistente al impacto necesario, homologado.	2,05	2,000h	4,10
			Importe total:	310.991,81

Gandia, Octubre 2011

E.A. Estudio de Arquitectura, S.L.


 José Tomás Pastor Puig
 Arquitecto




Cuadro de materiales

R.D.

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
1	Agua.	0,75	10.821,421 m ³	8.116,05
2	Cemento Portland con adición puzolánica I-2/25-A, según norma UNE 80.301, a granel.	91,11	1.033,846 t	94.523,76
3	Cemento Portland con adición puzolánica II-2/25-A, según norma UNE 80.301, a granel.	98,05	7,476 t	739,01
4	Cemento Portland con adición puzolánica III-2/25-A, según norma UNE 80.301, a granel.	93,07	180,473 t	16.796,02
5	Desarrollante líquido para acedades de madera, cerámica y metálicas.	1,08	3,312 kg	3,58
6	Incidencia trazo de frenado normal para porteros y emergencia, distribuido en garrafa de 5 kg.	0,72	685,096 kg	494,21
7	Resina coloidal cemento para revestimientos.	0,42	4.674,000 kg	1.964,00
8	Membrana preparada de resistencia característica 10 N/m ² , de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal III, transportada a una distancia máxima de 3 km, contadas desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 a 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.	24,70	6,470 m ³	160,17
9	Membrana preparada H-125 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20, transportada a una distancia máxima de 10 km, contadas desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 a 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.	42,93	323,750 m ³	13.887,86
10	Membrana preparada H-100 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20, transportada a una distancia máxima de 10 km, contadas desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 a 9 m ³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.	50,99	233,754 m ³	11.927,30
11	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	0,41	235,122 t	97,38
12	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.	9,81	160,877 t	1.578,20
13	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	6,05	1.914,030 t	11.589,79
14	Arena triturada, lavada, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	0,92	2.393,620 t	2.208,68
15	Arena de río, de granulometría 0/5.	0,15	338,776 t	50,816
16	Arena de río, de granulometría 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.	6,76	272,501 t	1.842,11
17	Grava triturada colada de granulometría 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	9,92	858,200 t	8.513,28
18	Grava triturada colada de granulometría 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.	6,58	1.749,365 t	11.505,22

Cuadro de materiales

Nº	Designación	Importe		
		Precio (euros)	Cantidad Empleada	Total (euros)
19	Grava autoterme caliza de granulometría 20/40, lavada, a pie de obra, suministrada mediante transporte con camión de 20 t., a una distancia media de 20 km.	6,39	1.593 t	10,11
20	Sabana artificial 0/20, lavada, .	4,81	10.176,676 u	72.659,91
21	Materiales de prefalsados.	3,10	20.959,530 u3	105.469,92
22	Fallas de apuntación.	10,32	117,533 t	9.220,69
23	Unidad de arena para consolidación de 17470 mm. (3 mm.), suministrada en cajas de 5 kg. aproximadamente.	1,07	0,009 kg	0,06
24	Alambre acerado Nº 13 (diámetro 2,0 mm.) suministrado en bobas de 5 kg.	1,06	0,118 kg	0,13
25	Arena rica para mortero 4/4-4000, de 5 (0,220) mm. de diámetro, homologada 10.274 kg/m ³ .	0,58	18.414 kg	10,68
26	Acero redondo corrugado A28-0008, de 12 (0,008) mm. de diámetro, homologado 10.858 kg/m ³ .	0,50	3.201 kg	1,73
27	Perfor. 4 40,0 mm., de acero laminado A-020.	0,47	7,900 kg	3,75
28	Ferrol estructural I02 IEN 104 HES L T de clase A-42 (proceso primario).	0,75	614,380 kg	461,50
29	Aditivo cerámico para cemento perforado 24x11,5x3 ca.	0,15	6.406,000 u	910,50
30	Ladrillo cerámico recto perforado a máquina de 24x11,5x5 ca.	0,30	147.629,090 u	50.698,44
31	Arqueta de registro prefabricada de hormigón armada para telefonía, tipo 28-III, de dimensiones interiores 10x30x50 cm., formada por solera y cuatro paredes con enlucido para protección alida de salidas, cubierta de hormigón formada por 2 niveles con una capa de chapa alacada, para una carga inferior a 3000 kg.	620,63	1,000 u	621,63
32	Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo 27-III, de dimensiones interiores 10x30x50 cm., formada por solera y cuatro paredes con enlucido para protección alida de salidas, cubierta de hormigón formada por 2 niveles con una capa de chapa alacada, para una carga inferior a 3000 kg.	513,10	27,000 u	13.855,00
33	Arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo 29, de dimensiones interiores 10x30x50 cm., formada por solera y cuatro paredes con enlucido para protección alida de salidas, cubierta de hormigón con tirador de acero galvanizado en caliente que apoya en un arco de chapa plástica, para una carga inferior a 3000 kg.	110,24	80,000 u	11.179,20
34	Tubo tipo rígido de PVC abocinado, de diámetro exterior 62 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m.	2,77	17,000 u	33,19
35	Tubo tipo rígido de PVC abocinado, de diámetro exterior 68 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m. Con un recubrimiento sobre el arco del tubo de 40% en concepto de juntas y conexiones.	1,31	6.846,820 u	90.562,71
36	Tubo tipo rígido de PVC abocinado, de diámetro exterior 110 mm, para canalizaciones eléctricas, subterráneas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 5 m. Con un recubrimiento sobre el arco del tubo de 40% en concepto de juntas y conexiones.	0,50	1.380,340 u	10.544,79
37	Tubo 90° abocinado para tubo rígido de PVC abocinado, de diámetro 68 mm.	0,38	43,360 u	309,56
